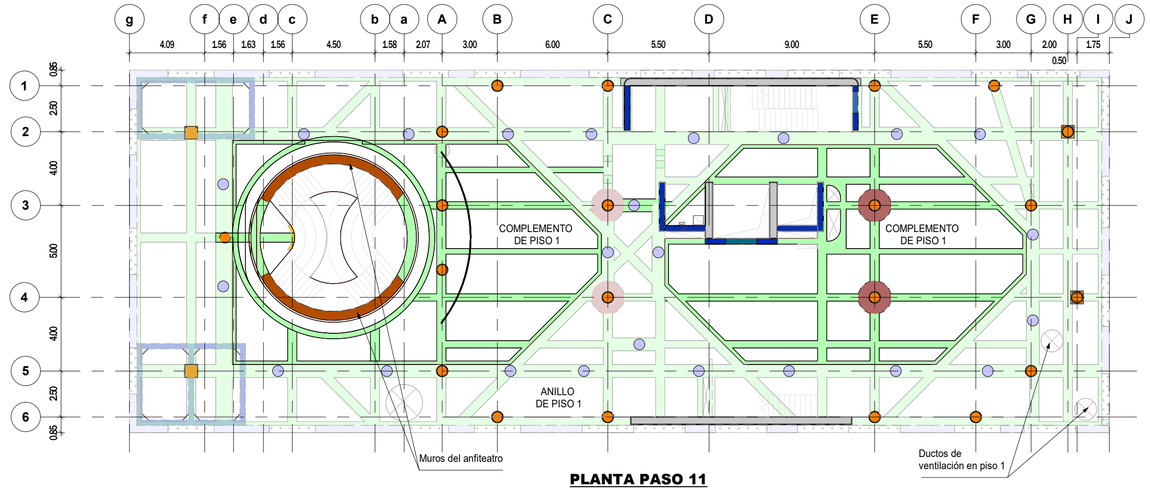

PLANTA PASO 11
Escala 1 : 200

- MUROS PANTALLA PREEXCAVADA
- BARRETES
- PILOTES CONSTRUCTIVOS
- PILOTES DEFINITIVOS
- CONSTRUCCIÓN DE VIGAS ANDEN Y VIGAS PUNTAL ANILLO PISO 1
- EXCAVACIÓN HASTA NIVEL INFERIOR DE CIMENTACIÓN
- CONSTRUCCIÓN PILOTES TANGENTES
- CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DEL EJE g HASTA EL EJE DE LOS PILOTES TANGENTES
- EXCAVACIÓN DE TANQUE ENTRE EL EJE DE PILOTES TANGENTES Y EJE J
- APUNTALAMIENTO TEMPORAL DE ZONA DE TANQUE
- CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, MUROS, COLUMNAS ZONA DE TANQUE ENTRE NIVELES B2 Y B1
- DESMONTE DE APUNTALAMIENTOS TEMPORALES DE CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN ENTRE EJES F Y J
- CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y COLUMNAS DE B1 A PISO 1
- **CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE ANFITEATRO**
- **CONSTRUCCIÓN DE VIGAS Y LOSAS DE LOS COMPLEMENTOS DE PISO 1**
- **CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS Y ESCALERAS ANFITEATRO**

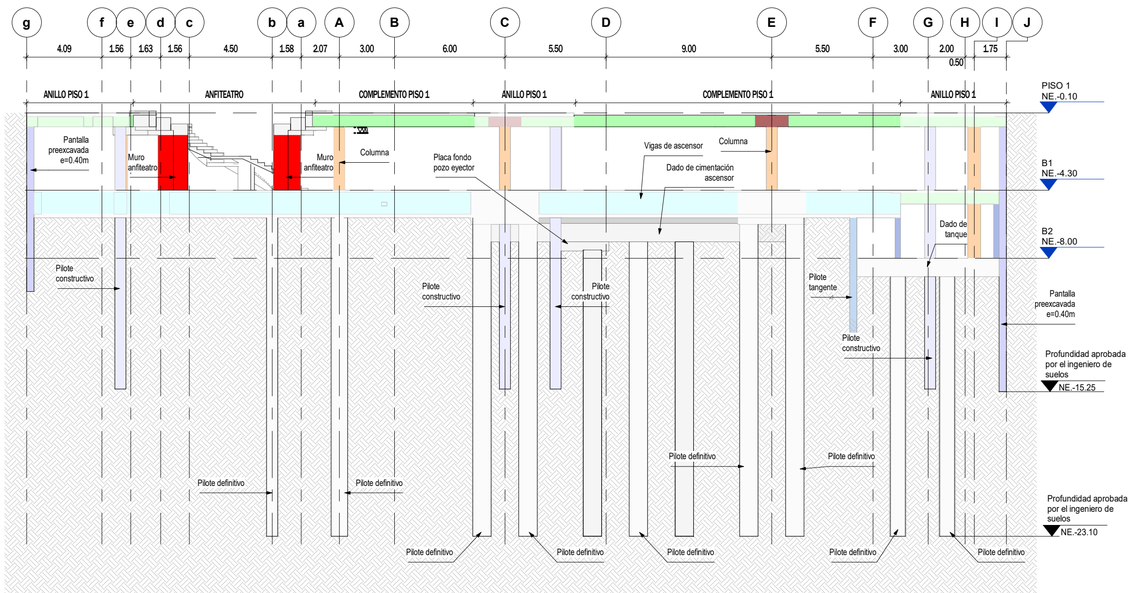

CORTE 1 PASO 11
Escala 1 : 200

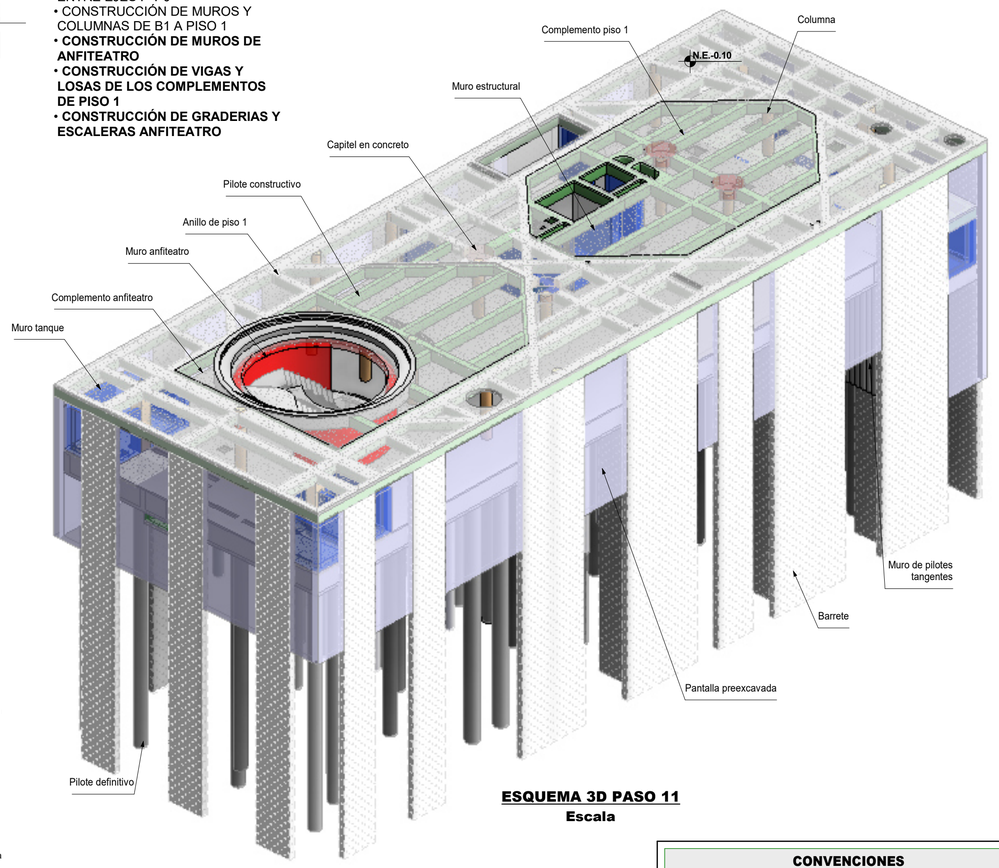

ESQUEMA 3D PASO 11
Escala

CONVENCIONES

- Indica pilotes constructivos
- Indica barretes
- Indica pantalla preexcavada
- Indica columnas
- Indica muros tanque
- Indica vigas cimentación
- Indica vigas de complementos de piso 1
- Indica capitel
- Indica muro anfiteatro

NOTAS

1. Ver planta de piso 1 en los PL N° 07.00, 07.02, 07.04, 07.06, 07.08
2. Ver planta y despieces de columnas y muros en los PL N° 04.00 a 04.07
3. Ver planos del anfiteatro en los PL N° 05.00 a 05.02

VERSIÓN : 0

PLANO N° 03.10

Aycardi Estructural

GERENTE DE PROYECTO
LUIS ENRIQUE AYCARDI F.
MAT. 2520212794 CND

INGENIERO
DANIEL E. QUICANO C.

MODELADOR
PAULA ANDREA MONTOYA RENDÓN

MODIFICACIONES	FECHA
Emisión Inicial	21-11-2025

HUMANISE STUDIO

EAN-0519- AES-01-EST

Calle 71 #9-84

SECUENCIA PROCESO CONSTRUCTIVO PASO 11

EAN-0519 -AES-01-EST-CIM-PL-212 03.10

REVISOR ESTRUCTURAL
JULIO CESAR SANMIGUEL CAMACHO
MAT. 25202-57738 CND

PLANO N° 03.10 VERSIÓN : 0
